



# Beispiel eines Bauberichts

Kunde: [REDACTED]

Projekt: Wandöffnung im EG

Datum: Di 12.09.2023

Wetter: 30\*Sonnig / Innen 27\*

Monteure:

[REDACTED]

An und Abfahrt:

9:30 – 18:30 Uhr

Geräte Maschinen:

Baustützen, Baustützenszubehör, Holztafeln, MagnetstahlKernbohrgerät, Hilti Säge mit Sauger, AVR Stemmer, Hammer

Vertraglich erbrachten Leistungen:

Stahlbauteile auf Baustelle geliefert. Stahlträger Flugrost Mechanisch entfernt.  
Für Träger Verbolzungen Und Stützen Verbindungen Bohrungen ausgeführt.  
Stahlträger Rostschutzgrundierung aufgetragen.  
Wandsägearbeiten. Mauerwerk abgebaut und seitlich gelagert  
Einzel Notabstützung direkt unter abgebaute Wand aufgebaut  
Baustelle besenrein aufgeräumt

Materialeingang:

Stahlträger 2Stück IP200E Länge:4,10m, MSH Q Stahlrohr 100x100x4mm Länge:2,30  
Stahlplatten 2 Stücke 200/120/15mm  
Rostschutzgrundierung

Baustellenbesuch:

[REDACTED] Innenausbauer

Fremdfirmen:

xxx

Baustellen Termine:

xxx

Anstehende Arbeiten:

Stahlstütze geschweißt beim Schlosser holen.  
Montage der Stahlbauteile

Bemerkungen  
Vorkommnisse:

Bitte beim Hausbegehen daraufachten das die Notabstützung aufgestellt ist und sich keiner da dran stößt oder verletzt.!

Unterschrift Monteur:

Unterschrift Kunde(in)

Wird als gelesen per Nachricht bestätigt

Foto Dokumentation auf folgende Seite:  Ja  Nein




Bericht Kopie wurde per.  E-Mail  iMessage  Whatsapp  Andere: Gesendet



# BAUUNTERNEHMEN

YASIN ALBAYRAK Meisterbetrieb

Baunternehmen Yasin Albayrak  
Schwurzstraße 5 · 65597 Hünfelden  
Tel. 06431 / 407 97 9  
Fax: 06431 / 407 97 96  
E-Mail: info@albayrak-bau.de

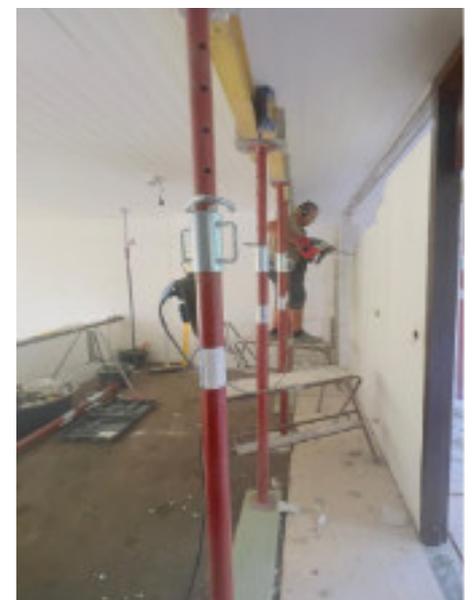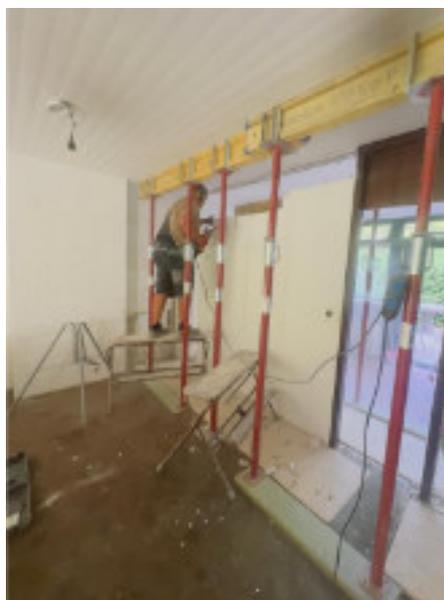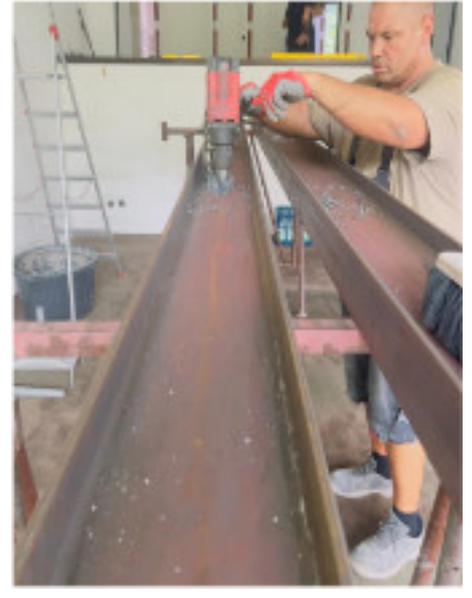



**Ende Bericht und Dokumentation**
